

FIAP

FIAP

SLIDER ▢■◀



TOGAF-ADM no SCRUM

Conteúdo

- TOGAF-ADM da Fase E até a Fase H
- Gestão Ágil de Projetos;
- SCRUM Framework;
- Plano de projeto SCRUM, utilizando Azure Boards;
- Product backlog;
- Sprint plan;
- KANBAN board.

TOGAF-ADM


Fase E. Oportunidades e Soluções

E. Oportunidades e Soluções


Na Fase E é onde desenvolvemos o chamado Roadmap da Arquitetura, que é um plano de mudança.

Para isso um mapa ou um plano de como sair da Arquitetura Base e chegar na Arquitetura Alvo é definido.

Nele as mudanças que se viu necessário realizar nas fases anteriores, são agrupadas em pequenos pacotes ou blocos de trabalho;



Esses pacotes são distribuídos ao longo do roadmap de acordo com prioridades definidas junto aos stakeholders, seguindo critérios que sejam adequados à situação;



agrega mais valor, mais fácil, mais rápido, mais barato, menos incerto, etc.


TOGAF-ADM

Fase E. Oportunidades e Soluções





O TOGAF-ADM separa muito bem o Planejamento de mudanças (Fase E, Roadmap da Arquitetura) do Plano de implementação (Fase F, Planejamento de Migração).

No **Roadmap** é possível ver o caminho, destino e bifurcações ainda pendentes de decisões.



Já o **Plano de Implementação** ajudará apenas a guiar a execução.







TOGAF-ADM

Fase F. Planejamento de Migração

F. Planejamento de Migração

Como já citado, foco da Fase F é a criação do Plano de Implementação, para isso são utilizadas técnicas de planejamento e gestão de projetos.

Com a ajuda dos gerentes de projeto da organização, os blocos de trabalhos definidos na Fase anterior serão transformados em **projetos** ou **portfólio de projetos** e passarão por todas as atividades típicas de gestão de projetos.




definição de cronograma, estimativa de custo e recursos, avaliação de riscos e outras dependências, priorização, etc.

Fase F. Planejamento de Migração

Importante: Perceba que aqui não há mais considerações sobre qual caminho tomar, ou avaliação de opções disponíveis. Isso já é passado, definido na Fase anterior.

O Plano de Implementação é o detalhamento das atividades necessárias para a execução dos blocos de trabalho do Roadmap.



TOGAF-ADM




Fase G. Governança de Implementação

G.

Governança de
Implementação

Aqui tudo que foi definido no Roadmap de Arquitetura e no Plano de Implementação é de fato executado. Portanto, é onde se costuma gastar a maior parte de todo o tempo que leva o esforço de mudança.

A implementação em si não é responsabilidade do arquiteto corporativo, ela é feita por outros times da empresa relacionados com cada um dos projetos e objetivos.



TOGAF-ADM

Fase G. Governança de Implementação

Então, a principal atividade do arquiteto corporativo na Fase G é a realização de revisões de conformidade.

Que são auditorias realizadas nos projetos em andamento para garantir que estejam sendo executados de acordo com a Arquitetura proposta.




É a própria Governança da Implementação.

TOGAF-ADM

Fase H. Gerenciamento de Mudança de Arquitetura


H.
GMUD* de
Arquitetura

O objetivo aqui é assegurar que os benefícios pretendidos com a mudança estão sendo atingidos e também de avaliar continuamente se a Arquitetura alvo se mantém relevante para a organização, dadas as circunstâncias e o estado atual.



Esse processo exige um monitoramento ininterrupto de novos requisitos, novas tecnologias, mudanças no ambiente de negócios, etc.

Quando uma mudança relevante é identificada, o Gerenciamento de Mudança irá determinar se deve-se ou não iniciar-se um novo ciclo do ADM para a evolução da Arquitetura Corporativa atual.



TOGAF-ADM




Gerenciamento de Requisitos

Gerenciam.
de Requisitos

Por que o círculo representando a Fase de Gerenciamento de Requisitos está no centro do gráfico do ADM?

Porque é um processo que interage com todas as fases e também entre ciclos completos do ADM.

Não se trata de um conjunto estático de requisitos, mas sim de um processo dinâmico pelo qual os requisitos de uma Arquitetura Corporativa e suas eventuais mudanças futuras são:



Identificados, Armazenados, Servem de entrada para uma Fase do ADM ou são resultado da execução de uma delas.

TOGAF-ADM

Visão geral



Preliminary Phase: Prepare the organization for adopting TOGAF.

Phase A: Architecture Vision: Define the scope, stakeholders, and vision.

Phase B: Business Architecture: Develop the business architecture.

Phase C: Information Systems Architectures, which includes data and application architecture.

Phase D: Technology Architecture: Design the technology architecture.

Phase E: Opportunities and Solutions: Identify delivery vehicles for the architecture defined.

Phase F: Migration Planning: Develop a detailed implementation plan.

Phase G: Implementation Governance: Oversee the implementation.

Phase H: Architecture Change Management: Manage changes to the new architecture.

TOGAF-ADM + Scrum


FIAP

H - Atualização ou inclusão de novos requisitos

G - Sprint e suas cerimônias

F - Definição das releases e backlogs das sprints

E - Definição do backlog do produto (épicos, features e PBIs)

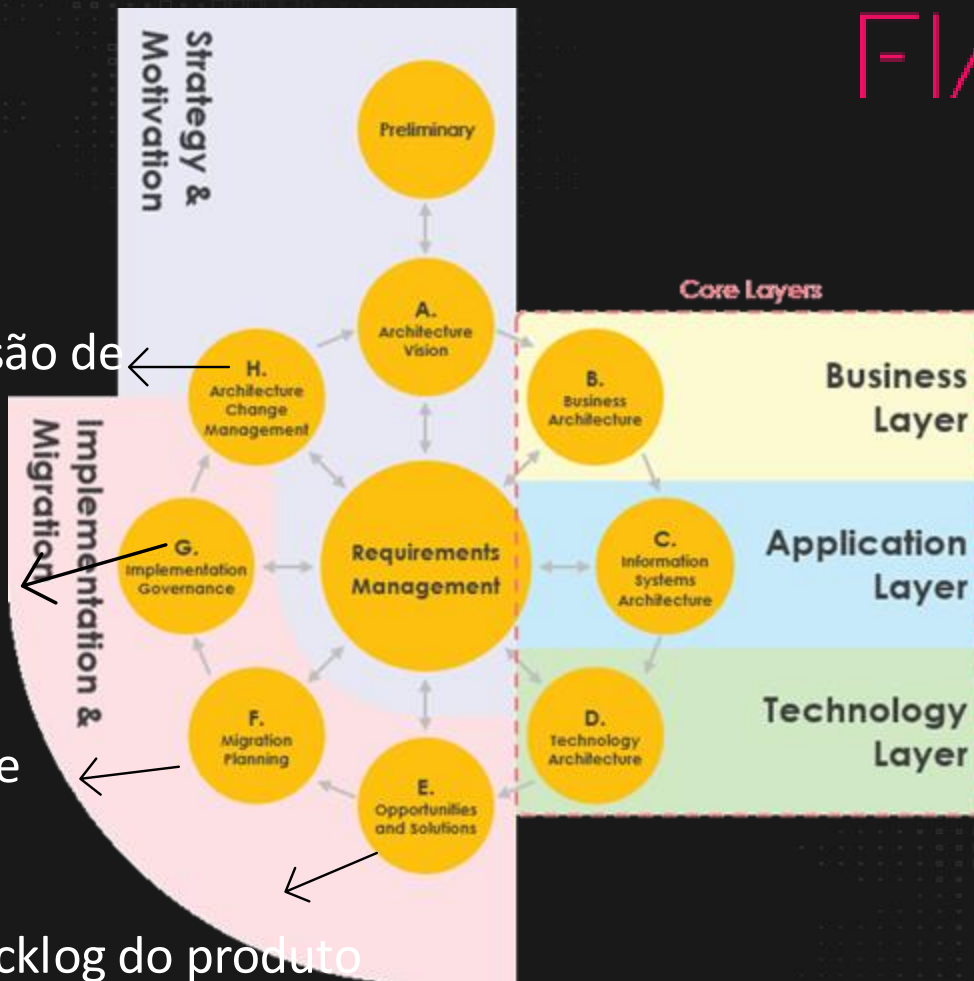

TOGAF-ADM

+ Scrum



Phase E: Opportunities and Solutions: Identify delivery vehicles for the architecture defined.

No Scrum: Definição do backlog do produto (épicos, features e PBIs)

Phase F: Migration Planning: Develop a detailed implementation plan.

No Scrum: Definição das releases e backlogs das sprints

Phase G: Implementation Governance: Oversee the implementation.

No Scrum: Sprint e suas cerimônias



Phase H: Architecture Change Management: Manage changes to the new architecture.

No Scrum: Atualização ou inclusão de novos requisitos

Architecture Supports Product and Sprint Backlog Definition

A Sprint – Architecture Iteration Should Deliver:

- Features
- Requirements
- Enhancements
- Bugs Correction (Technical Debt)
- Product/Solution Knowledge
- Interdependencies
- Input to Conform the Product Backlog
- Support for the User Stories Definition (Sprint Backlog)

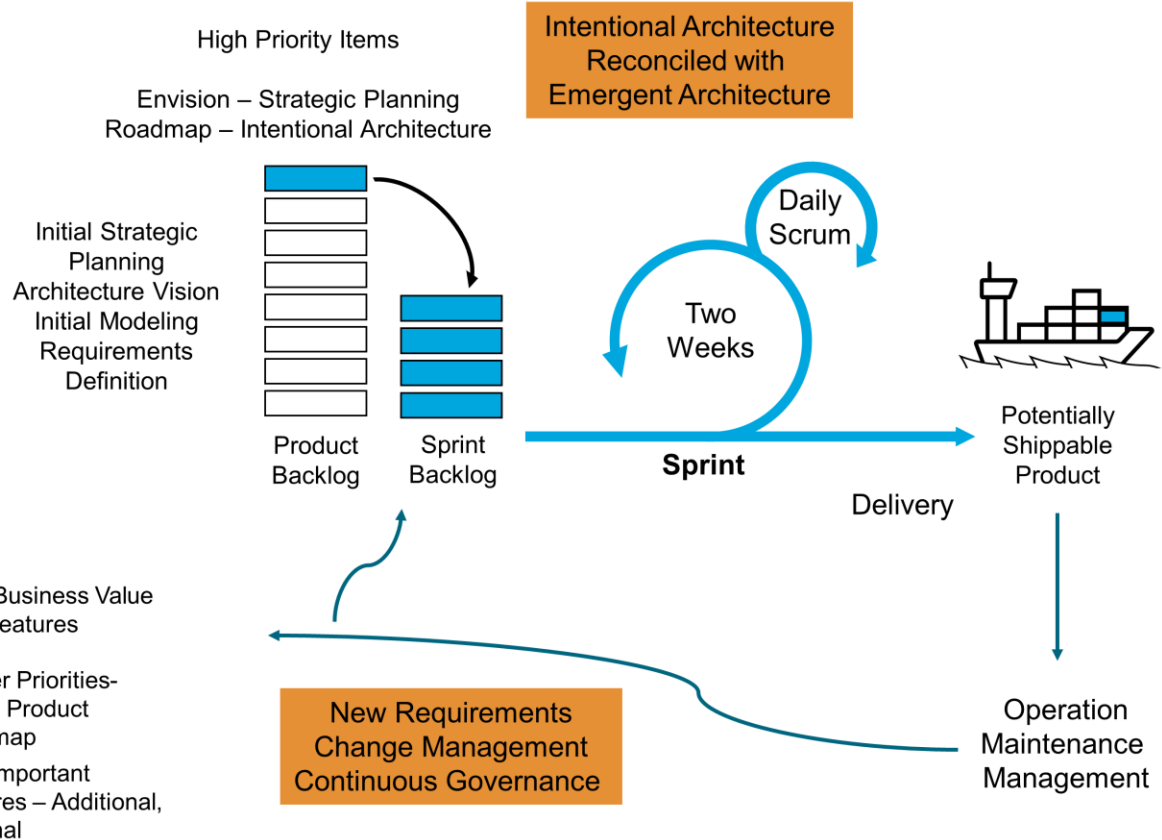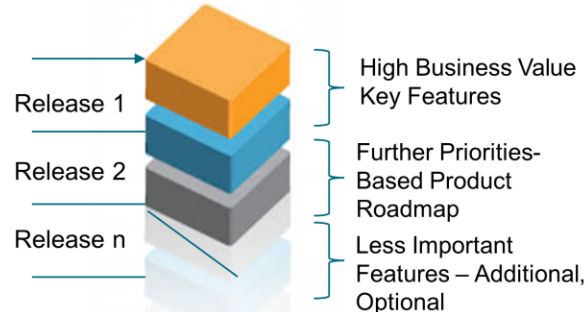

TOGAF-ADM + Scrum



Fundamentally, the TOGAF Standard supports what architects do – they understand, specify, and govern. The phases of the ADM are:

Understand

Phase A – Architecture Vision: understand the problem/opportunity, sketch the solution, and identify the broad transition approach

Phases B-D – Business/Information Systems/Technology Architecture: identify what is needed (Architecture Building Blocks (ABBs))

During these phases, a recommended practice is to identify the potential solution implementations (Solution Building Blocks (SBBs))

Specify

Phase E – Opportunities and Solutions: select from the candidate set of SBBs to best fit with the ABBs of Phases B to D and how they will interoperate to deliver the business service levels required, and the most appropriate implementation transitions

Phase F – Migration Planning: organize the resources to deliver the transitions in a controlled fashion

Govern

Phase G – Implementation Governance: ensure the reuse/build/acquisition and deployment activities are properly organized and deployed in line with the agreed contract and specifications

Phase H – Architecture Change Management: ensure that the change is properly planned, structured, and delivers the business value that is expected

Gestão Ágil de Projetos

Método de **gestão de projetos** em pequenos ciclos iterativos e incrementais (iterações curtas)

Cada iteração produz um incremento do produto, concluído, pronto para implantação



Adaptativa e permite mudanças tanto no produto quanto no próprio processo

Scrum e XP são os exemplos mais populares deste tipo de gestão

O TRIÂNGULO DE FERRO

FIXO

ESTIMADO

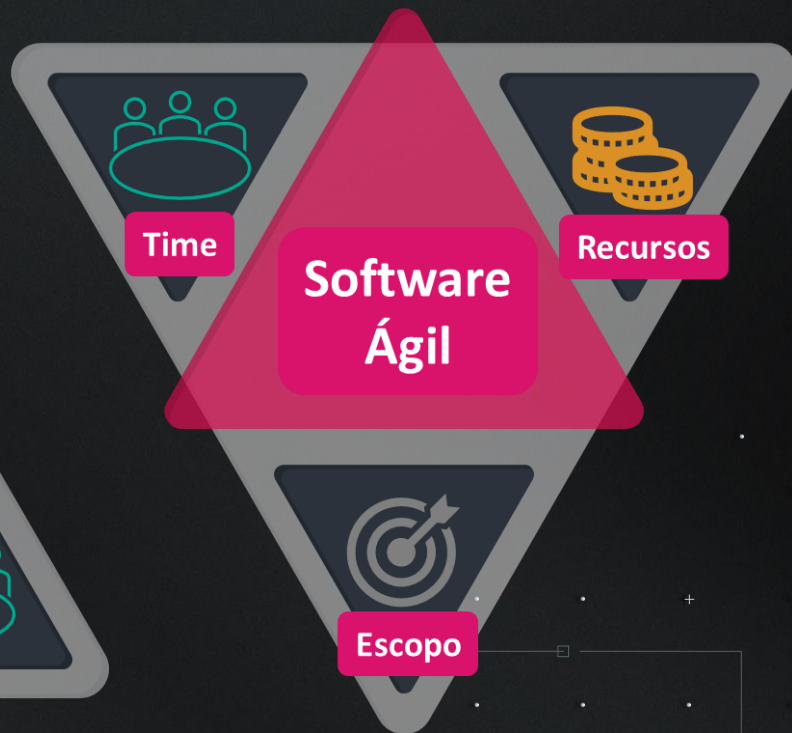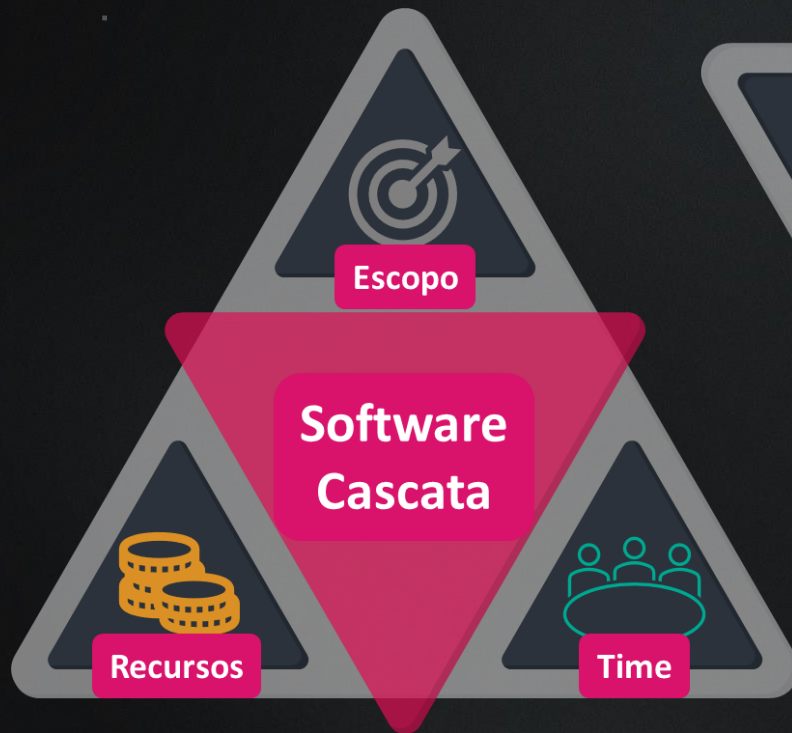

Afinal, o que é Scrum?

Primeiramente é importante sabermos o que o Scrum não é.

- Scrum não é uma metodologia prescritiva ou um conjunto de práticas de engenharia de software.
- Também não é um processo ou uma técnica para criar produtos.

Então o que é?

- Scrum é um framework leve e simples criado para gerenciar o desenvolvimento de produtos.

Definição do Scrum

"Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. "

Um framework de processo:

- Não é um processo completo
- Intencionalmente incompleto
- Não especifica os passos para construir um produto
- Mas dentro do framework, uma variedade de processos e técnicas podem ser empregados

Pilares do SCRUM

FIAP

TRANSPARÊNCIA

INSPEÇÃO

ADAPTAÇÃO





COURAGE

Os membros do Scrum Team têm a coragem de, fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis.

FOCUS

Seu foco principal é o trabalho da Sprint para fazer o melhor progresso possível em direção a essas metas.

COMMITMENT

O Scrum Team se compromete a atingir seus objetivos e suportar uns aos outros.

RESPECT


Se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes, e são respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham.

OPENNESS

O Scrum Team e seus stakeholders são abertos quanto ao trabalho e os desafios.

SCRUM

Artefatos e Eventos

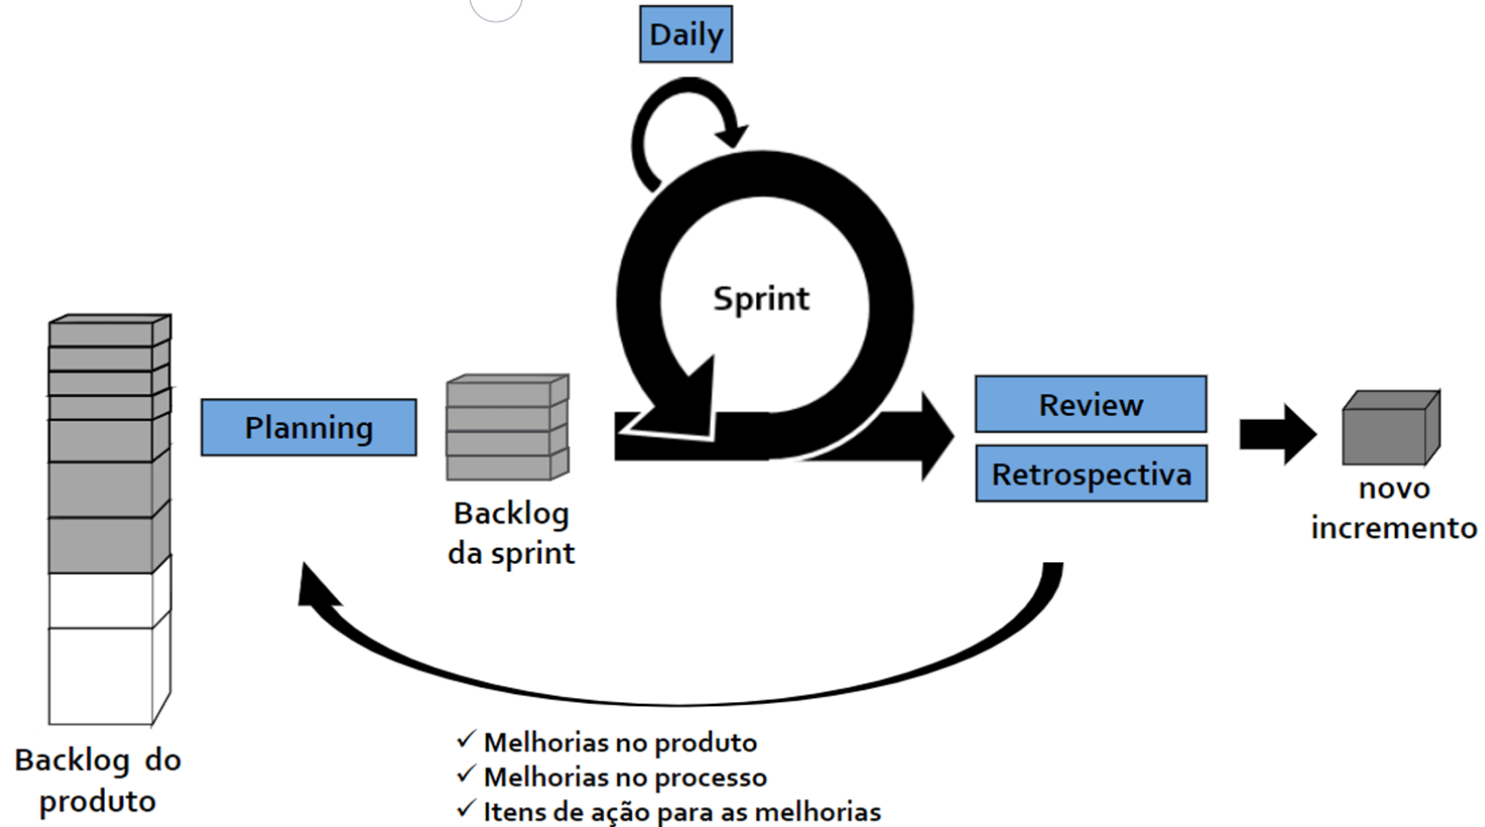

SCRUM

Como funciona o framework scrum?

Em síntese:

1. O Product Owner (PO) organiza o trabalho a ser feito em um Backlog de Produto.
2. O Time Scrum seleciona itens do **Backlog do Produto para o Backlog da Sprint** e o transforma em um **Incremento do Produto** durante uma Sprint.
3. Tanto o Time Scrum quanto os stakeholders (demais envolvidos) inspecionam os resultados e fazem os ajustes necessários para a próxima Sprint.
4. Repetir.



SCRUM

Papéis SCRUM



**Product
Owner**

Conhece o interesse dos clientes, assegura que as entregas adicionem valor e que o backlog esteja sempre priorizado, atualizado e que reflita aquilo que é mais importante para os usuários, clientes e para a empresa.



**Scrum
Master**

Tem um papel de mentor, que remove impedimentos e desenvolve constantemente as pessoas. Tem perguntas, não respostas. Caminha com a equipe num constante processo que busca identificar o que não está funcionando e o que deve ser mudado.



**Time
Dev**

Time autogerenciável (quem faz o quê, quando e como), empoderado e independente. Possuem autoridade para tomar decisões, assumir riscos e responsabilidades. Equipe multidisciplinar e com profundos conhecimentos sobre sua área de atuação.

SCRUM

Eventos SCRUM

FIAP

SPRINT


A Sprint em si, a qual engloba os demais eventos



SCRUM

Como funciona o framework scrum?

Artefatos Scrum:



- **Product Backlog:** é uma lista emergente e ordenada do que é necessário para melhorar o produto. É a única fonte de trabalho a ser realizado pelo Time Scrum. Comprometido com a Meta do Produto (*Product Goal*).



- **Sprint Backlog:** é composto pela Meta da Sprint (o porquê), o conjunto de itens do Backlog de Produto selecionados para a Sprint (o quê) e também um plano exequível para entregar o incremento (o como). Comprometido com a Meta da Sprint (*Sprint Goal*).



- **Incremento:** é um salto concreto em direção à Meta do Produto. Cada incremento é aditivo a todos os incrementos anteriores e integralmente validado, garantindo que todos os incrementos funcionem juntos. Para fornecer valor, o incremento deve ser utilizável. Comprometido com a Definição de Pronto (*Definition of Done – DoD*).


SCRUM

Product Backlog

O Product Backlog é uma lista priorizada de tudo o que pode ser incluído em um produto, além de ser a manifestação da visão e do business case para o produto. O backlog é composto por itens de backlog do produto (PBIs – Product Backlog Items).

Os PBIs podem ser qualquer coisa, desde requisitos de mercado, até casos de uso, até especificações.


É essencial representar a perspectiva do usuário final.

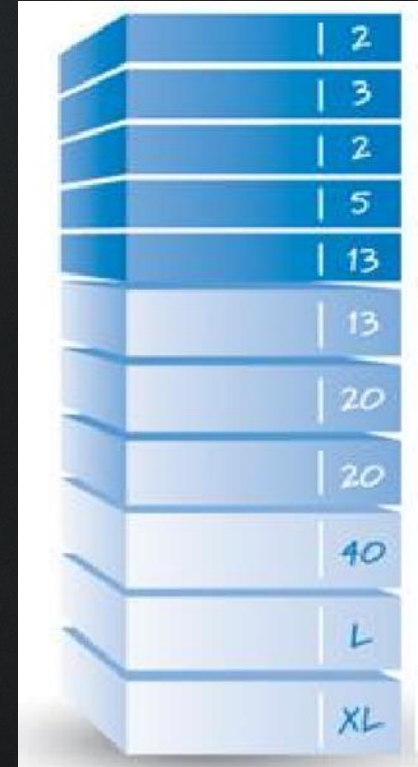

SCRUM

Sprint Backlog


O Backlog da Sprint é uma lista ordenada de Itens do Backlog do Produto que a equipe acredita poder concluir durante o próximo Sprint. Esses itens são extraídos da parte superior do Backlog do produto durante a reunião de planejamento da sprint.

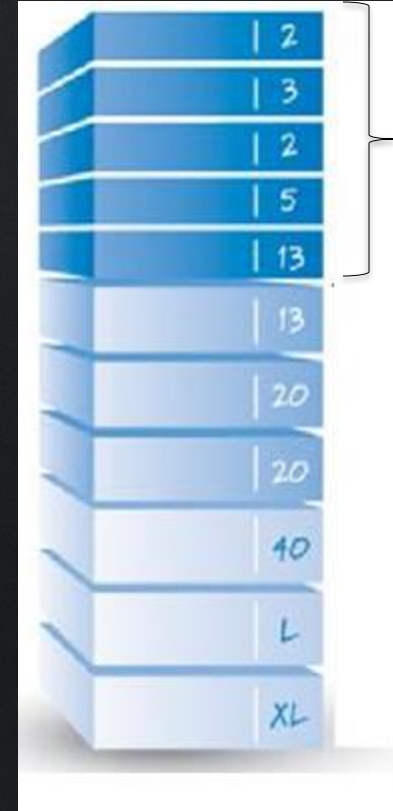


Sprint Backlog

SCRUM

Processos e Fases

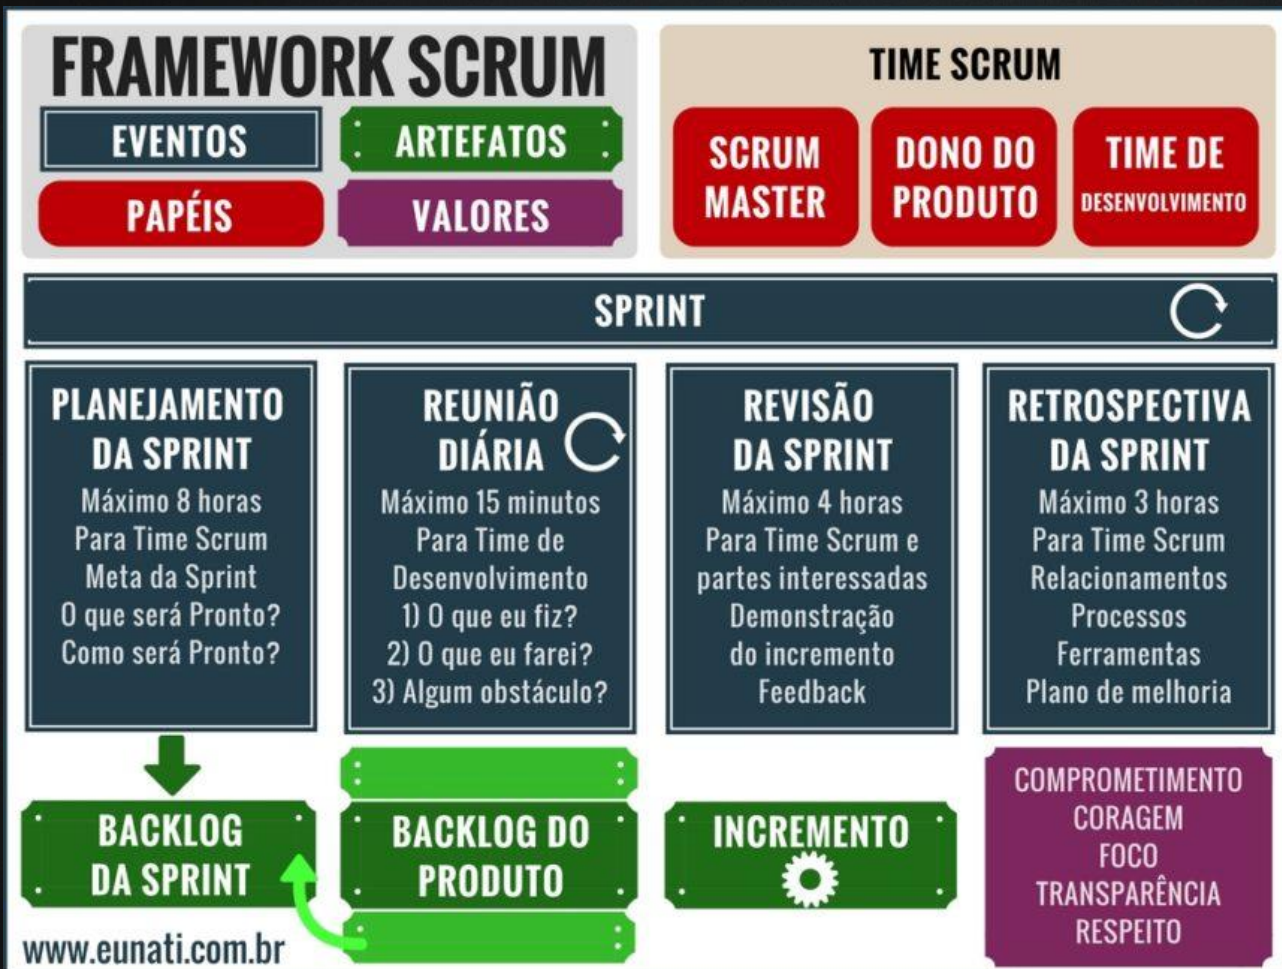


SCRUM

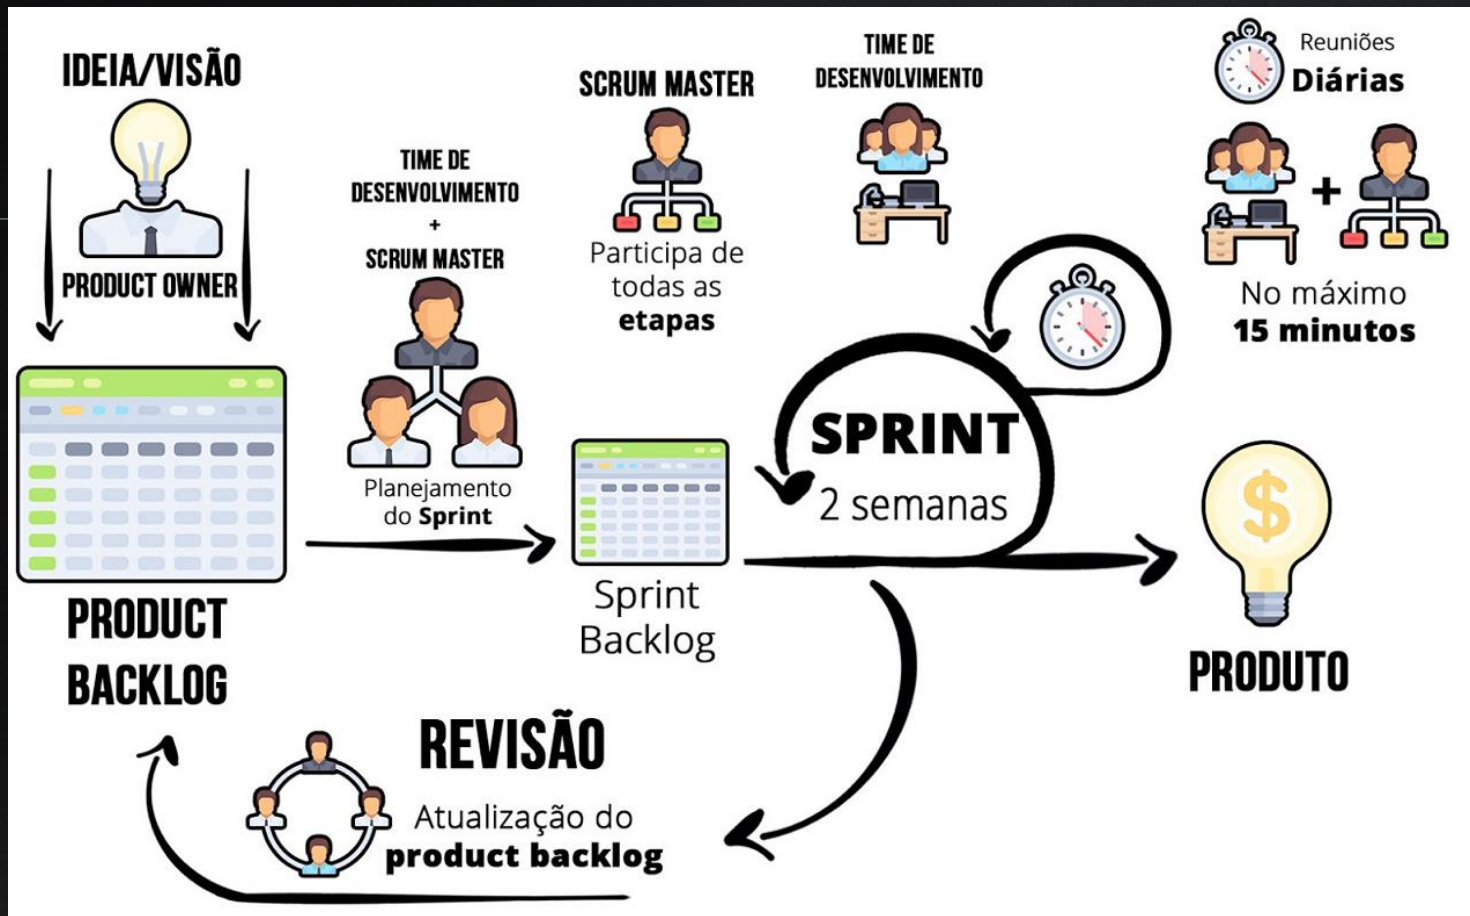

PRODUCT/PROJECT NAME:

FIAP

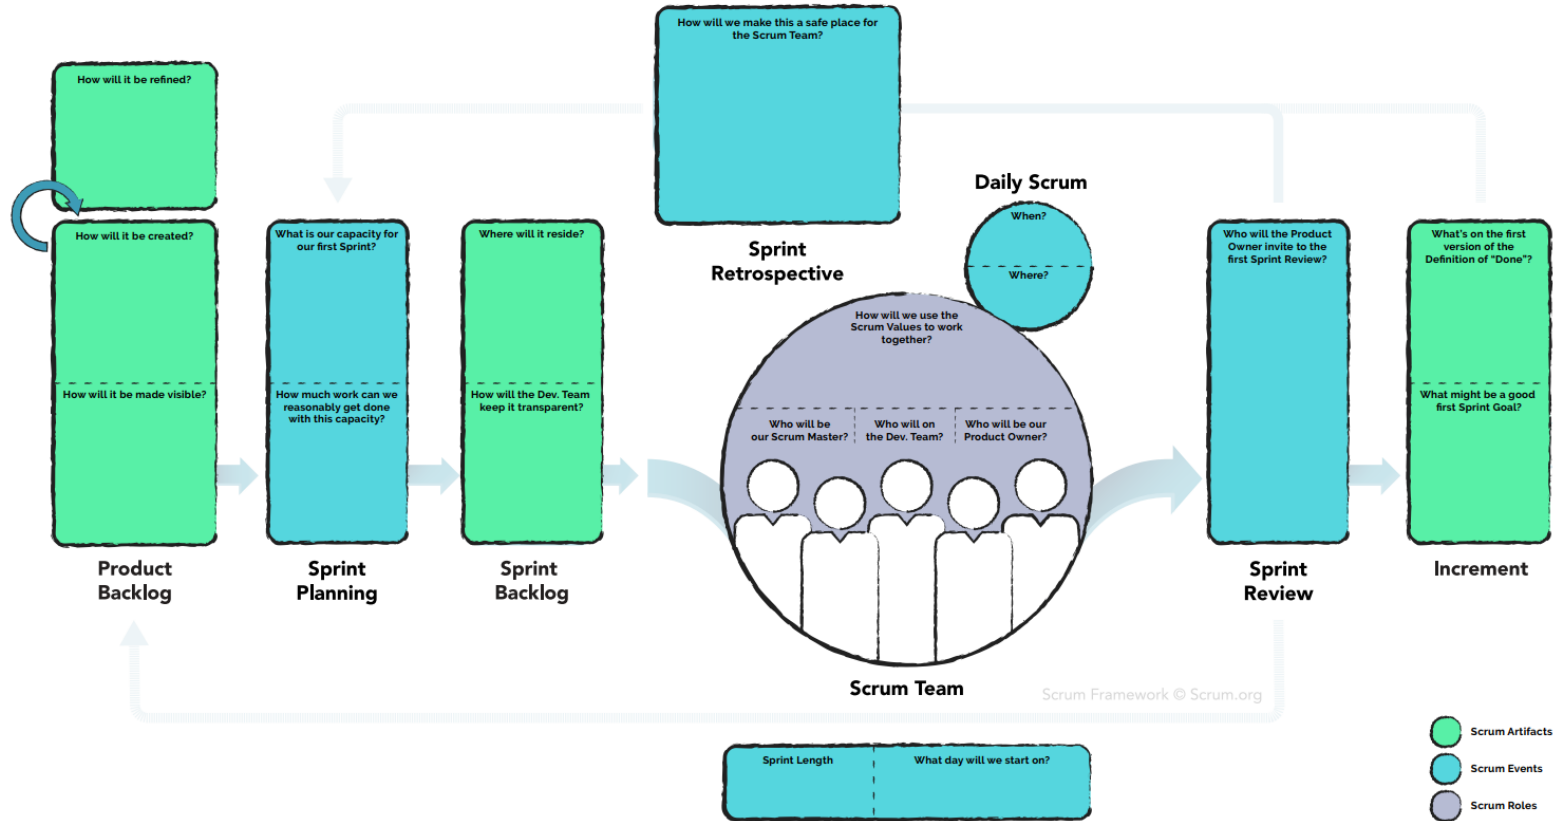

Exemplo de Quadro Kanban



A forma mais comum de visualizar o trabalho é criando um “**quadro Kanban**” e adicionando **cartões** nos quais possamos colocar as demandas que estão sendo trabalhadas.

SCRUM

Release Plan


Scrum Release do Produto é a entrega de um ou mais Incrementos do Produto prontos, gerados pelo Time de Desenvolvimento em um ou mais *Sprints* sucessivos, para que sejam utilizados.

Projetos com Scrum realizam Releases frequentes, com intervalos máximos de alguns poucos *Sprints* entre elas.

A realização de Releases ao longo do projeto tem três objetivos principais: obter *feedback* frequentemente, prover retorno ao investimento dos clientes e dar um senso de progresso a eles.


SCRUM

Release Plan

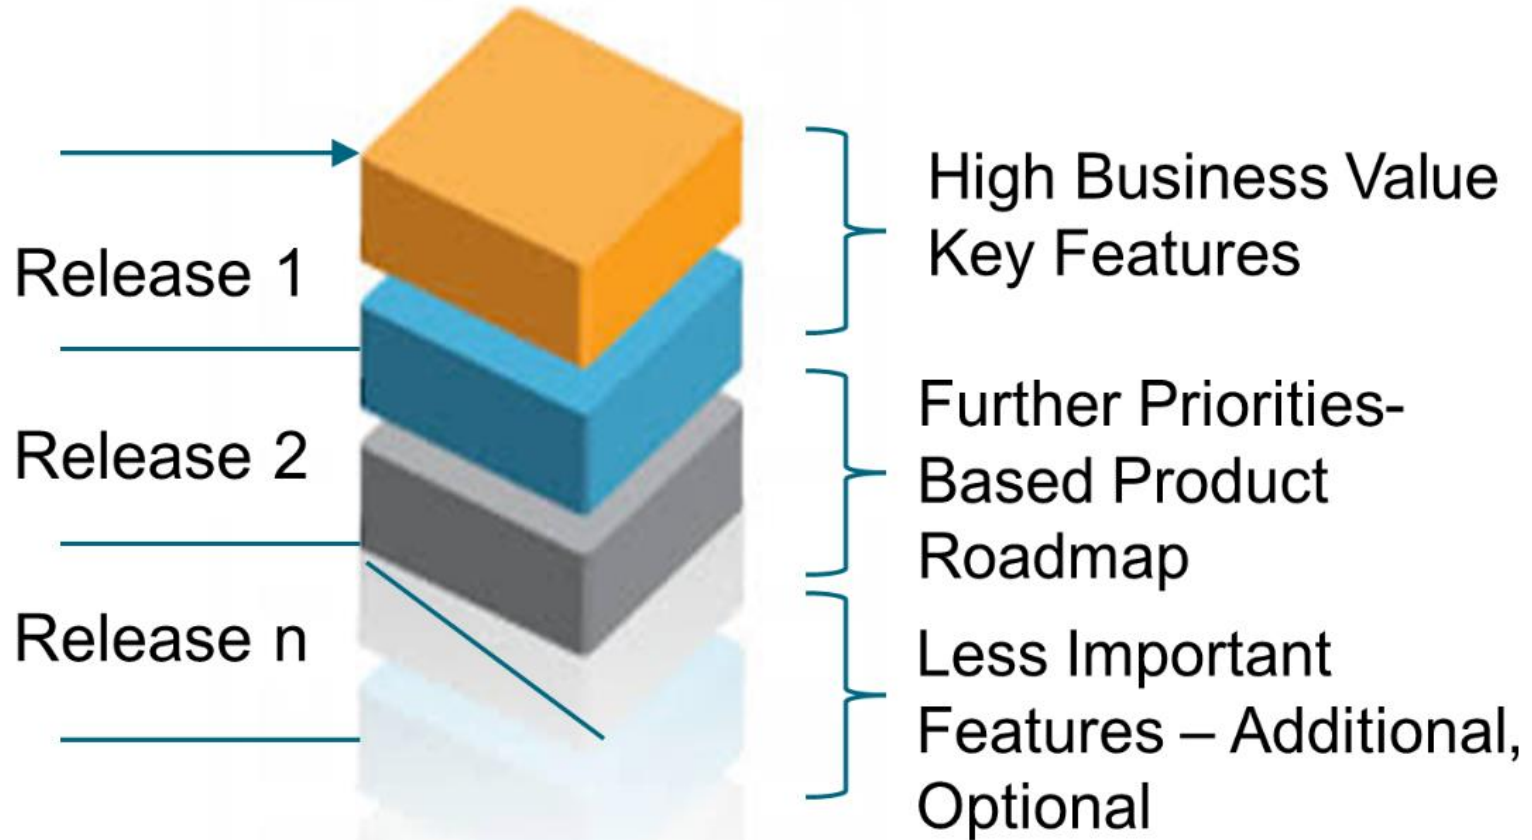

SCRUM

Release Plan

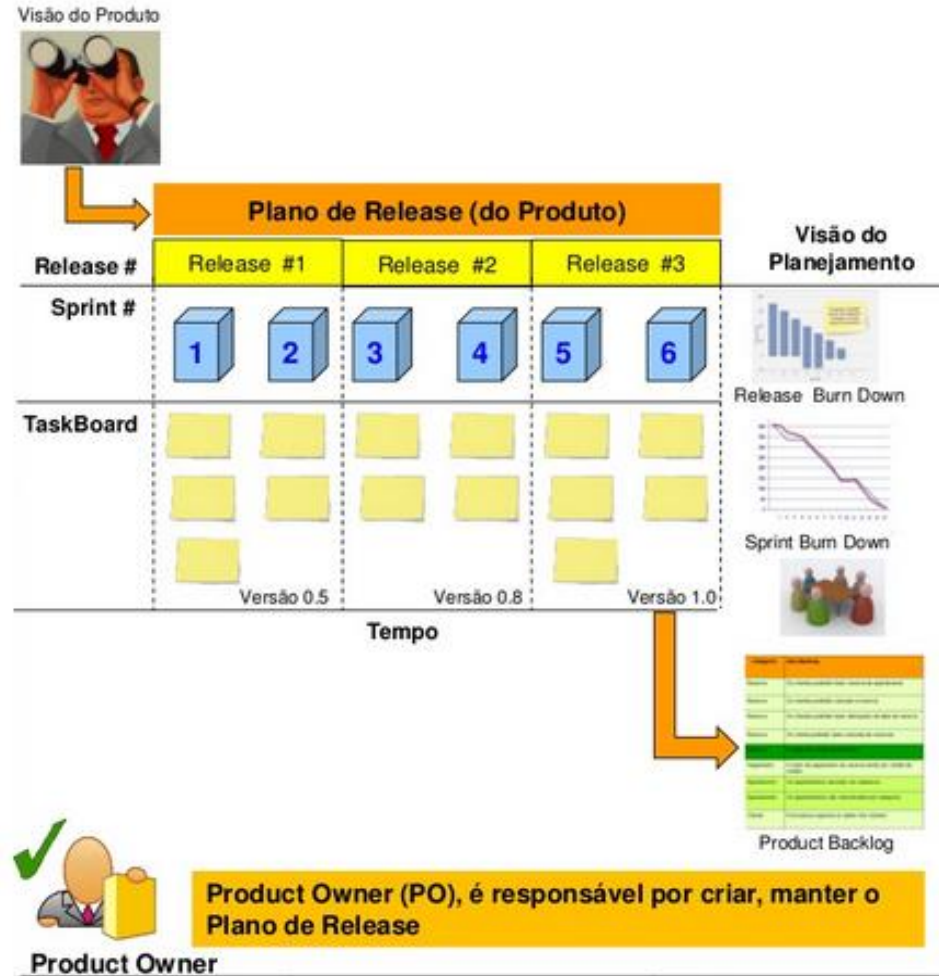

FIAP
